



GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

São Paulo, 03 de dezembro de 2013

OFÍCIO SLT GSA Nº 458/ 2013

Assunto: Requerimento de Informação nº 0350/2013 – Deputado Marco Aurélio, solicitando informações sobre áreas do bota-fora na Rodovia dos Tamoios, no Município de Paraibuna.

Dra. Anadil Abujabra Amorim
Procuradora do Estado Assessora Chefe

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Desenvolvimento Rodoviário do Estado de São Paulo – DERSA, constante do CE-PR nº 858 de 28/11/2013, com as informações devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Moacir Rossetti
Secretário Adjunto da
Secretaria de Logística e Transportes



GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Dersa

CE-PR 858/2013

São Paulo, 28 de novembro de 2013

Ref.: Rodovia Nova Tamoios

Senhor Secretário,

Em atendimento ao Requerimento de Informação nº 350, do Deputado Marco Aurélio, de 21 de novembro de 2013, que solicita informações sobre áreas de bota-fora na Rodovia dos Tamoios, no Município de Paraibuna, encaminho Relatório de Esclarecimentos com as informações solicitadas

Permaneço à disposição de Vossa Excelência, para quaisquer esclarecimentos julgados necessários e apresento votos de estima e consideração.

LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
Diretor Presidente

À Sua Excelência
Dr. SAULO DE CASTRO ABREU FILHO
Digníssimo Secretário Estadual de Logística e Transportes
São Paulo – SP



RELATÓRIO DE ESCLARECIMENTOS
NOVA TAMOIOS - PLANALTO
SITUAÇÃO DME's



Situação dos Depósitos de Materiais Excedentes – DME

Lote 1 (km 11+500 ao km 35+800)

26 Novembro 2013

DME 29,5

Localização: Município de Paraibuna/SP

Rodovia dos Tamoios (SP 099) – km 29+500 Pista Sul.

Situação: Finalizada a deposição de Material Terroso.

Forração Vegetal: 10% - Lançamento de Hidrossemeadura

Drenagem Definitiva: 0% realizada.

Previsão Término: Dezembro/2013.

Registros Fotográficos:





Dersa

DME 30,5

Localização: Município de Paraibuna/SP

Rodovia dos Tamoios (SP 099) – km 30+500 Pista Sul.

Situação: Finalizada a deposição de Material Terroso.

Forração Vegetal: 10% - Lançamento de Hidrossemeadura

Drenagem Definitiva: 0% realizada.

Previsão Término: Dezembro/2013.

Registros Fotográficos:



Depósito de Material Excedente (DME) licenciado, não utilizado.

DME	km	Município	Situação
30,2	30+200 PS	Paraibuna	Não utilizado



Situação dos Depósitos de Materiais Excedentes – DME

Lote 2 (km 35+800 ao km 61)

27 Novembro 2013

OBRA - 201

Localização: Município de Paraibuna/SP.

Rodovia dos Tamoios (SP 099) – km 39+500 Pista Sul.

Situação: Finalizada a deposição de Material terroso.

Forração Vegetal: 90% - Lançamento de Hidrossemeadura e placas de grama.

Drenagem Definitiva: 0% realizada.

Registros Fotográficos:





Dersa

OBRA - 205


Localização: Município de Paraibuna/SP.

Rodovia dos Tamoios (SP 099) – km 43+600 Pista Norte + Caminho de serviço.

Situação: Finalizada a deposição de Material terroso.

Forração Vegetal: 0% - Lançamento de Hidrossemeadura e placas de grama.

Drenagem Definitiva: 0% realizada.

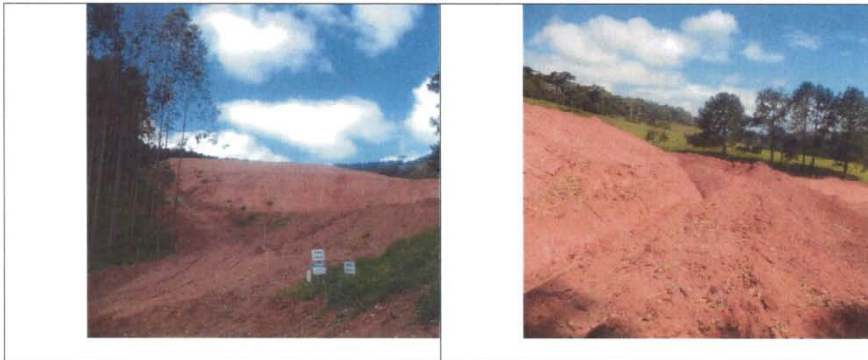



OBRA - 208

Localização: Município de Paraibuna/SP.

Rodovia dos Tamoios (SP 099) – km 44+200 Pista Norte + Caminho de serviço.

Situação: Finalizada a deposição de Material terroso.

Forração Vegetal: 0% - Lançamento de Hidrossemeadura e grama em placa.

Drenagem Definitiva: 0% realizada.

Registros Fotográficos:





Dersa

OBRA - 212

Localização: Município de Paraibuna/SP.

Rodovia dos Tamoios (SP 099) – km 47+200 Pista Sul.

Situação: Finalizada a deposição de Material terroso.

Forração Vegetal: 65% - Lançamento de Hidrossemeadura

Drenagem Definitiva: 0% realizada.

Registros Fotográficos:





OBRA - 214

Localização: Município de Paraibuna/SP

Rodovia dos Tamoios (SP 099) – km 51+000 Pista Norte + Caminho de serviço.

Situação: Em execução.

Forração Vegetal: 75% - Lançamento de Hidrossemeadura e grama em placa.

Drenagem Definitiva: 0% realizada.

Registros Fotográficos:





OBRA - 215

Localização: Município de Paraibuna/SP

Rodovia dos Tamoios (SP 099) – km 60+000 Pista Norte + Caminho de serviço.

Situação: Finalizada a deposição de Material terroso.

Forração Vegetal: 75% - Lançamento de Hidrossemeadura e grama em placa.

Drenagem Definitiva: 0% realizada.

Registros Fotográficos:





OBRA - 217

Localização: Município de Paraibuna/SP


Rodovia dos Tamoios (SP 099) – km 40+400 Pista Sul + Caminho de serviço.

Situação: Em execução.

Forração Vegetal: 0%

Drenagem Definitiva: 0%.

Registros Fotográficos:

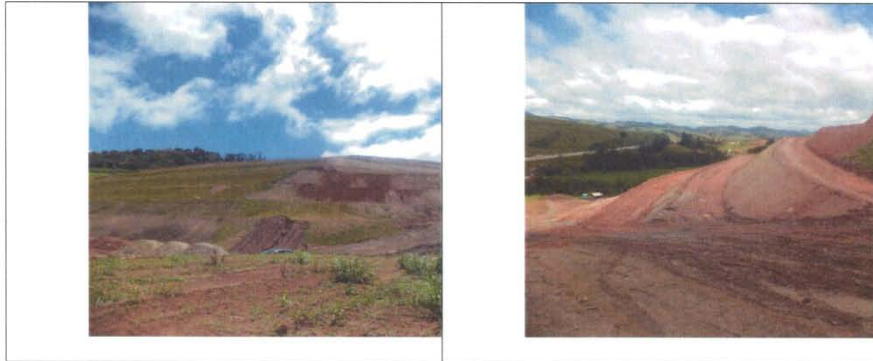

Divisão de Obras 1, 28 de novembro de 2013.

PEDRO PAULO DANTAS DO AMARAL CAMPOS
Gerente da Divisão de Obras 1
