


OF. PR 330 / 2018
21 de setembro de 2018


Publique-se, Junte-se, Cancele-se, Arquive-se
24/09/18

Presidente

Requerimento nº 85, de 2018.

Vimos em atenção ao ofício SGP 1162/2018, o qual reitera o conteúdo dos ofícios SGP nº 454/18, 623/18, 895/18 e 1048/18, informar, consoante cópias anexas, que as respostas já foram encaminhadas a essa Coordenadoria em 19 de abril e 10 de julho, ambos de 2018, respectivamente pelos Ofícios CPTM PR nº 127/2018 e nº 230/2018.

Destacamos ainda que os prazos de urgência dos contratos comportam período de 12 meses de operação assistida.

Atenciosamente,


PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES
Diretor Presidente

02529

8/09

1

Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual CAUÊ MACRIS
DD. Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
São Paulo - SP



OF. PR. 127 / 2018
19 de abril de 2018

Assunto: Expediente STM/411552/2018 - Requerimento de Informação nº 85/2018 – Deputado Enio Tatto – informações sobre o cronograma de obra atualizado para execução e entrega da Estação Varginha da Linha 9 – Esmeralda da CPTM.

Fazemos referência ao Despacho 104/2018 – AP nº 072/18, datado de 09 de abril de 2018, através do qual Vossa Senhoria encaminhou à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM para manifestação, cópia do Requerimento de Informação nº 85/2018, solicitando informações sobre o cronograma de obra atualizado para execução e entrega da Estação Varginha da Linha 9 – Esmeralda da CPTM para informa o que segue:

1. Qual é o cronograma de obra atualizado para execução e entrega da estação Varginha da Linha 9 – Esmeralda da CPTM?

Resposta DEBC - Obras Civis: necessário concluir o processo licitatório da concorrência de obras da Estação Varginha – 4ª licitação - não publicada, em fase de elaboração do edital (GPP/GRC/AEI).

2. A licitação das obras da Linha 9 – Esmeralda da CPTM foi dividida em lotes, conforme informação obtida junto a Companhia. Diante desse fato, questiona-se:

2.1. Quantas são as Licitações:

Resposta DEBC - Obras Civis: 4 licitações

2.2. Descreva os lotes em cada licitação.

Resposta DEBC - Obras Civis:

2.2.1 1ª Licitação: Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha – **Lote 1** Construção de dois viadutos rodoviários (VR1 – Micronésia e VR2 – JacopoTorriti), obras de contenções, viário, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.

Ilustríssimo Senhor
FERNANDO HIROMITI MARUYAMA
D.D. Coordenador de Relações Institucionais - CRI
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - STM
São Paulo – SP

OF.PR. 127 /2018

Contratada: **Construtora Ubiratan**

Autorização de Início de Objeto AIO – 10/04/2018

Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.

Início do Contrato em 16/04/18.

Início das obras em campo: após atendimento 4 condicionantes da LI (Licença de Implantação)

2.2.2. 2ª Licitação: Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha – Lote 2
Construção de dois viadutos rodoviários (VR3 – Ligação Leste/Oeste VR4 – Paulo Guilguer Reimberg), obras de contenções, viário, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.

Contratada: **Consórcio Verdebranco/WVG**

Autorização de Início Objeto – AIO – 10/04/2018

Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.

Início do Contrato em 16/04/18.

Início das obras em campo: após atendimento 4 condicionantes da LI (Licença de Implantação)

2.2.3. 3ª Licitação: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos, visando Complementação da Extensão Ferroviária da Linha 9 Esmeralda, Trecho entre as Estações Grajaú e Varginha – Lote 1

Conclusão da Estação Mendes/Vila Natal – estrutura de concreto, estrutura metálica, acabamentos, rotas táteis, comunicação visual fornecimento e instalação de equipamentos elétrico/eletrônico e equipamentos auxiliares (escadas rolantes, elevador e sistema de ventilação), obras do sistema viário (pavimentação/drenagem/sinalização viária/iluminação pública), obras de drenagem e remanejamentos de água e esgoto, construção viaduto ferroviário, implantação de Via Permanente e Rede Aérea autocompensada e remodelação do pátio existente em Grajaú.

Seção Pública agendada para o dia 08/05/2018 para entrega das propostas técnicas/comerciais conforme edital da licitação.

OF.PR.127 /2018

2.2.4. 4ª Licitação – não publicada, em fase de elaboração do edital (GPP/GRC/AEI)

2.3. Descreva e aponte, geometricamente, onde serão realizadas as obras.

Resposta DEBC - Obras Civis: Vide anexos 1 e 2

2.4. Qual é o prazo de duração de cada lote da obra licitada?

Resposta DEBC - Obras Civis:

2.4.1. 1ª Licitação: 18 meses – término do contrato out/19

2.4.2. 2ª Licitação: 18 meses – término do contrato out/19

2.4.3. 3ª Licitação: 18 meses – em fase de licitação - entrega das propostas técnicas/comercial: 08/mai/18

2.4.4. 4ª Licitação: em fase de elaboração do Termo de Referência (edital)

2.5. Qual é o valor contratado em cada lote?

Resposta DEBC - Obras Civis:

2.5.1 1ª Licitação: R\$ 6.673.048,21 (valor do contrato)

2.5.2 2ª Licitação: R\$ 18.350.767,10 (valor do contrato)

2.5.3 3ª Licitação: R\$ 88.967.680,78 (valor Termo Referência)

2.5.4 4ª Licitação: planilha sendo elaborada na GPP/GRC.

2.6. Qual é o cronograma de início das obras em cada lote?

2.6.1 1ª Licitação: 16/04/2018

2.6.2 2ª Licitação: 16/04/2018

2.6.3 3ª Licitação: em fase de licitação

2.6.4 4ª Licitação: cronograma em fase de elaboração na GPP.

2.7. Há impedimento para a execução de algum lote das obras?

Resposta DEBC - Obras Civis:

2.7.1 Conforme Licença de Implantação das obras da Extensão da Linha 9 Esmeralda os serviços só podem ser iniciados após a contratada atender as diretrizes das condicionantes da LI.

2.7.2 Desapropriações em andamento.

2.7.3 Remanejamentos de interferências das concessionárias e prefeitura (Eletropaulo, Sabesp e PMSP)

OF.PR. 127 /2018

3. Havia uma previsão de entrega em 2018. Isso irá se concretizar?

Resposta DEBC - Obras Civis: não há previsão de entrega em 2018.

4. Quando a estação Varginha será entregue a população?

Resposta DEBC - Obras Civis: necessário concluir o processo licitatório da concorrência de obras da Estação Varginha.

Respeitosamente,



VITOR WILSON GARCIA
Diretor Presidente em Exercício



EXTENSÃO LINHA 9 – ESMERALDA

GRAJAU – VARGINHA




LOTE 1:

OBRAS COMPLEMENTARES PÁTIO GRAJAU ATÉ PI ESTRADA DOS MENDES

OBRAS VIADUTOS RODOVIARIOS VR 1 - MICRONÉSIA VR2 - JACOPO TORRITI

KM 41+600 A 44+200

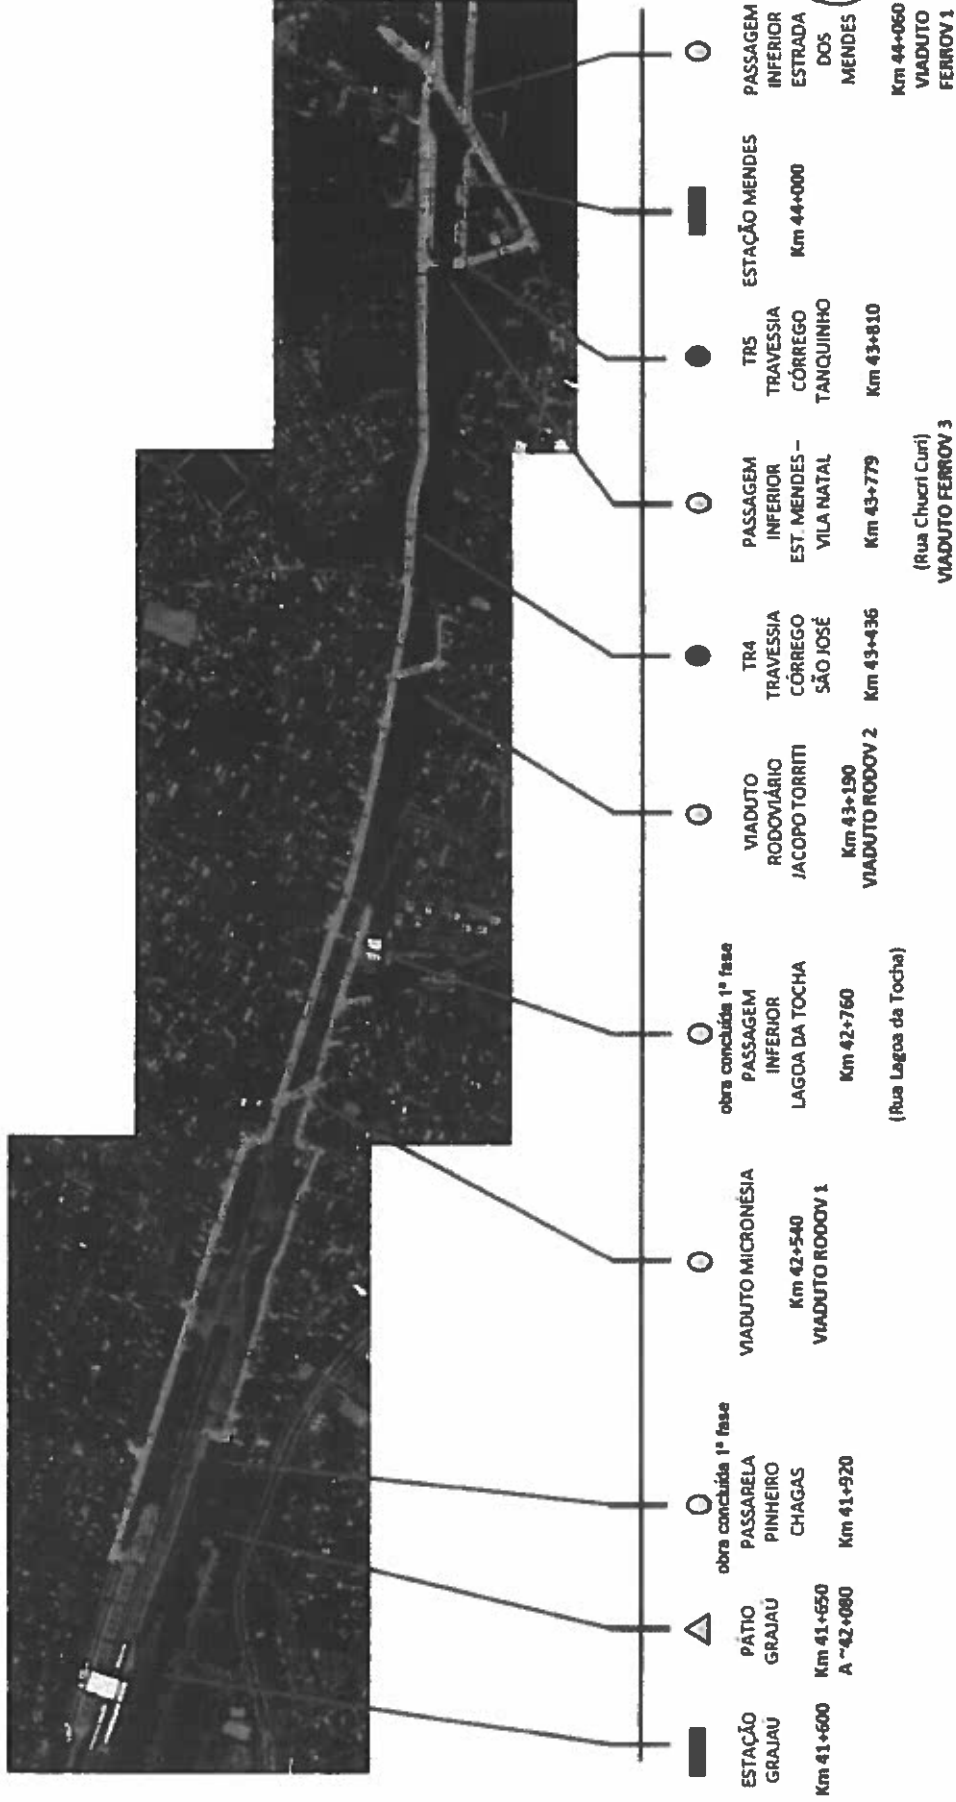




**EXTENSÃO LINHA 9 – ESMERALDA
GRAJAU – VARGINHA**



LOTE 2:

**OBRAS COMPLEMENTARES PI ESTRADA DOS MENDES ATÉ O PÁTIO VARGINHA
OBRAS VIADUTOS RODOVIÁRIOS VR 3 - LIGAÇÃO LESTE/OESTE VR 4 PAULO G. REIMBERG**

km 44+200 A 46+300



Cópia
Prot: 293991



OF. PR. 230/2018
10 de julho de 2018

Recebido em 11/07/2018, às 09 h 30 min
Protocolo da Secretaria dos Transportes Metropolitanos

PROTOCOLO
LEGISLATIVO

Erica Fabetti

(nome legível)

Assunto: Esclarecimentos sobre a estação Varginha da Linha 09 – Esmeralda da CPTM

Reportamo-nos ao Despacho nº 188/2018 (AP nº 110/18) de 29/06/2018 pelo qual essa Assessoria Parlamentar da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 149/2018, do Nobre Deputado Estadual Enio Tatto, solicitando manifestações desta Companhia a respeito da estação Varginha na Linha 09 – Esmeralda sendo que, sobre o requerido, e articuladamente, reproduzindo as questões formuladas, aduzimos o que segue:

1. Qual é o cronograma de obra atualizado para execução e entrega da estação Varginha da Linha 09 – Esmeralda da CPTM?

Na presente data (julho/2018), o empreendimento como um todo encontra-se em determinadas fases, sejam elas de execução ou de adequações contratuais (planilhas / projetos), envolvendo as exigências do agente financeiro - CEF. Dessa forma não há um cronograma físico concluído para todas as obras da Extensão da Linha 9.

A futura estação de Varginha, está compreendido no trecho de obras civis, cuja contratação encontra-se ainda na fase de atendimento das exigências com a CEF. A previsão de assinar contrato: *Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando a Complementação das Obras Civis da Linha 9 - Esmeralda - trecho Grajaú e Varginha, Lote 2*, é em novembro deste ano. O cronograma contratual é de 30 meses.

2. A licitação das obras da Linha 9 – Esmeralda da CPTM foi dividida em lotes, conforme informação obtida junto a Companhia. Diante desse fato, questiona-se:

2.1. Quantas são as Licitações:

Obras civis são quatro (4) licitações e as de sistemas também são quatro (4).

2.2. Descreva os lotes em cada licitação.

2.4. Qual é o valor contratado em cada lote?

Ilustríssimo Senhor
Doutor FERNANDO HIROMITI MARUYAMA
DD. Coordenador de Relações Institucionais da
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM
São Paulo – SP

OF.PR. 230/2018

- 2.5. Qual é o prazo de duração de cada lote da obra licitada?
2.6. Qual é o cronograma de início das obras em cada lote?

Obras Civis:

Licitação – Lote 1 – Viadutos Rodoviários: Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha.
Construção dos viadutos rodoviários (VR1 – Micronésia e VR2 – JacopoTorriti) envolvendo obras de contenções, viários, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.
Contratada: **Construtora Ubiratan**
Valor do contrato R\$ 6.673.048,21
Autorização de Início de Objeto AIO – 10/04/2018
Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.
Início do Contrato em 16/04/18.
Prazo de execução: 18 meses.

Licitação – Lote 2 – Viadutos Rodoviários: Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha – Lote 2
Construção dos viadutos rodoviários (VR3 – Ligação Leste/Oeste VR4 – Paulo Guilguer Reimberg) envolvendo obras de contenções, viários, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.
Contratada: **Consórcio Verdebianco/WVG**
Valor do Contrato R\$ 18.350.767,10
Autorização de Início Objeto – AIO – 10/04/2018
Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.
Início do Contrato em 16/04/18.
Prazo de execução: 18 meses.

Licitação – Lote 1 – Obras Complementares: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos, visando Complementação da Extensão Ferroviária da Linha 9 Esmeralda, Trecho entre as Estações Grajaú e Varginha – Lote 1
Envolvem a conclusão da Estação Mendes/Vila Natal – com serviços executivos de estrutura de concreto, estrutura metálica, acabamentos, rotas táteis, comunicação visual fornecimento e

OF.PR. 230/2018

instalação de equipamentos elétrico/eletrônico e equipamentos auxiliares (escadas rolantes, elevador e sistema de ventilação), obras do sistema viário (pavimentação/drenagem/sinalização viária/iluminação pública), obras de drenagem e remanejamentos de água e esgoto, construção viaduto ferroviário, implantação de Via Permanente e Rede Aérea autocompensada e remodelação do pátio existente em Grajaú.

Em processo licitatório na fase de análise de documentações para habilitação. Por enquanto, a empresa ganhadora: **Consórcio Concrejato / Alberoni e Arruda**, com o valor de R\$ 76.399.192,33.

Prazo contratual: 30 meses

Licitação – Lote 2 – Obras Complementares: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos, visando Complementação da Extensão Ferroviária da Linha 9 Esmeralda, Trecho entre as Estações Grajaú e Varginha – Lote 2

Envolvem a conclusão da Estação Varginha – com serviços executivos de estrutura de concreto, estrutura metálica, acabamentos, rotas táteis, comunicação visual fornecimento e instalação de equipamentos elétrico/eletrônico e equipamentos auxiliares (escadas rolantes, elevador e sistema de ventilação), obras do sistema viário (pavimentação/drenagem/sinalização viária/iluminação pública), obras de drenagem e remanejamentos de água e esgoto, construção viaduto ferroviário, implantação de Via Permanente e Rede Aérea autocompensada em todo o trecho, inclusive no novo pátio de Varginha.

Na fase de análise de documentações no agente financeiro – CEF, para posterior processo licitatório.

Sistemas:

Licitação – Sistemas de Sinalização e Telecomunicações: Contrato assinado no valor de R\$ 49.324.404,41 e prazo de execução de 24 meses.

Licitação – Adequação do CCO: Contrato assinado no valor de R\$ 42.483.047,01 e prazo de execução de 12 meses.

Licitação – Sistemas de Energia: Aguardando análise da documentação enviada a CEF, para posterior processo licitatório.

Pag. - 3

OF. PR. 230/2018

Licitação – Reforço de Rede Aérea: Contrato assinado no valor de R\$ 11.290.854,77 e prazo de execução de 24 meses.

2.3. Descreva e aponte, geometricamente, onde serão realizadas as obras.

Vide anexos 1 e 2

2.7. Há impedimento para a execução de algum lote das obras?

- Licença de Implantação das obras da Extensão da Linha 9 - Esmeralda os serviços só podem ser iniciados após a contratada atender as diretrizes das condicionantes da LI.
- Desapropriações em andamento.
- Remanejamentos de interferências das concessionárias e prefeitura (Eletropaulo, Sabesp e PMSP)

2.8. Havia uma previsão de entrega em 2018. Isso irá se concretizar?
Não.

2.9. Quando a estação Varginha será entregue a população?
Sem previsão. Uma vez que se encontra em fase de análise no agente financeiro – CEF, para posteriores deliberações de processo licitatório e contratação.


Apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES
Diretor Presidente

ANEXO 1
EXTENSÃO LINHA 9 – ESMERALDA
GRAJAU – VARGINHA

LOTE 1:
 OBRAS COMPLEMENTARES PÁTIO GRAJAU ATÉ PI ESTRADA DOS MENDES
 OBRAS VIADUTOS RODOVIÁRIOS VR 1 - MICRONÉSIA VR2 - JACOPO TORRITI
km 41+600 A 44+200

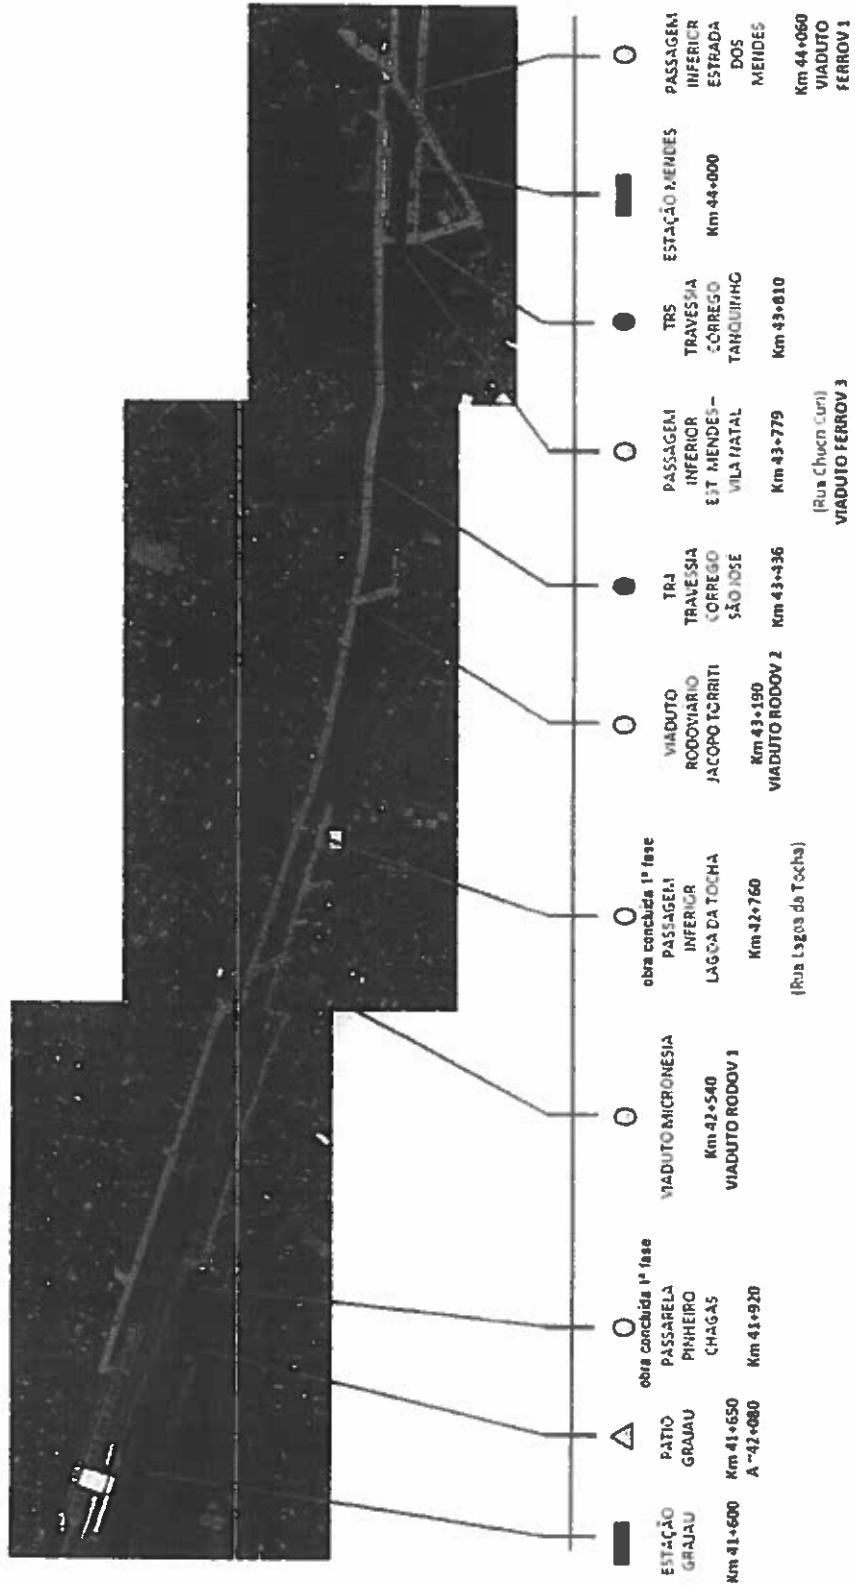



ANEXO 2

EXTENSÃO LINHA 9 – ESMERALDA

GRAJAU – VARGINHA

LOTE 2:

OBRAS COMPLEMENTARES PI ESTRADA DOS MENDES ATÉ O PÁTIO VARGINHA
OBRAS VIADUTOS RODOVÁRIOS VR 3 - LIGAÇÃO LESTE/OESTE VR 4 PAULO G REIMBERG

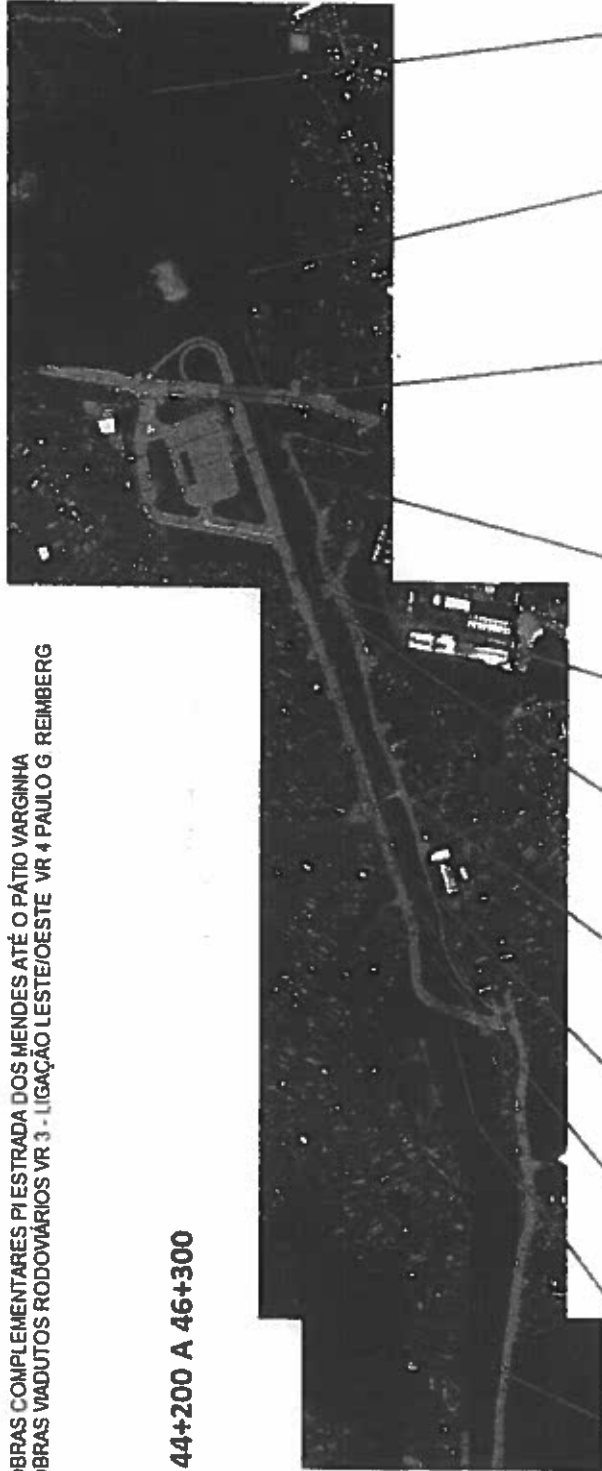

km 44+200 A 46+300

