



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

São Paulo, 18 de outubro de 2018.
Ofício CRI/STM nº 130 /2018

Referência: Requerimento de Informação nº 85, de 2018
Autor: Deputada Estadual Enio Tatto
Assunto: Informações sobre o cronograma de obra atualizado para a execução e entrega da Estação Varginha da Linha 9 – Esmeralda

Senhor Assessor,

Com os meus cordiais cumprimentos, reportando-me ao assunto em referência, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria manifestação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, consubstanciada no OF. PR. 127/2018, prestando as informações pertinentes à matéria (cópia anexa).

Cabe ressaltar que o retardo em responder ao Processo ATL: 00000000085/2018 se deu em virtude desta Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM ter se manifestado através do Ofício GS/STM nº 317/2018 ao Requerimento de Informação nº 149/2018, também de autoria do Deputado Estadual Enio Tatto, e de igual teor (cópia anexa).

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

FERNANDO HIROMITI MARUYAMA
Coordenador de Relações Institucionais

Ao Senhor
RODRIGO EDSON FIERRO
Dirigente da Assessoria Técnica da Casa Civil - Gabinete do Governador
Av. Morumbi, 4.500
05650-905 São Paulo, SP

MH.

OF. PR. 127 / 2018
19 de abril de 2018

Assunto: Expediente STM/411552/2018 - Requerimento de Informação nº 85/2018 – Deputado Enio Tatto – informações sobre o cronograma de obra atualizado para execução e entrega da Estação Varginha da Linha 9 – Esmeralda da CPTM.

Fazemos referência ao Despacho 104/2018 – AP nº 072/18, datado de 09 de abril de 2018, através do qual Vossa Senhoria encaminhou à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM para manifestação, cópia do Requerimento de Informação nº 85/2018, solicitando informações sobre o cronograma de obra atualizado para execução e entrega da Estação Varginha da Linha 9 – Esmeralda da CPTM para informa o que segue:

1. Qual é o cronograma de obra atualizado para execução e entrega da estação Varginha da Linha 9 – Esmeralda da CPTM?

Resposta DEBC - Obras Civis: necessário concluir o processo licitatório da concorrência de obras da Estação Varginha – 4ª licitação - não publicada, em fase de elaboração do edital (GPP/GRC/AEI).

2. A licitação das obras da Linha 9 – Esmeralda da CPTM foi dividida em lotes, conforme informação obtida junto a Companhia. Diante desse fato, questiona-se:

2.1. Quantas são as Licitações:

Resposta DEBC - Obras Civis: 4 licitações

2.2. Descreva os lotes em cada licitação.

Resposta DEBC - Obras Civis:

2.2.1 1ª Licitação: Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha – **Lote 1** Construção de dois viadutos rodoviários (VR1 – Micrônésia e VR2 – Jacopo Torriti), obras de contenções, viário, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.

Ilustríssimo Senhor
FERNANDO HIROMITI MARUYAMA
D.D. Coordenador de Relações Institucionais - CRI
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - STM
São Paulo – SP

OF.PR. 127 /2018

Contratada: Construtora Ubiratan

Autorização de Início de Objeto AIO – 10/04/2018

Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.

Início do Contrato em 16/04/18.

Início das obras em campo: após atendimento 4 condicionantes da LI (Licença de Implantação)

2.2.2. 2ª Licitação: Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha – Lote 2
Construção de dois viadutos rodoviários (VR3 – Ligação Leste/Oeste VR4 – Paulo Guilguer Reimberg), obras de contenções, viário, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.

Contratada: Consórcio Verdebranco/WVG

Autorização de Início Objeto – AIO – 10/04/2018

Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.

Início do Contrato em 16/04/18.

Início das obras em campo: após atendimento 4 condicionantes da LI (Licença de Implantação)

2.2.3. 3ª Licitação: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos, visando Complementação da Extensão Ferroviária da Linha 9 Esmeralda, Trecho entre as Estações Grajaú e Varginha – Lote 1

Conclusão da Estação Mendes/Vila Natal – estrutura de concreto, estrutura metálica, acabamentos, rotas táteis, comunicação visual fornecimento e instalação de equipamentos elétrico/eletrônico e equipamentos auxiliares (escadas rolantes, elevador e sistema de ventilação), obras do sistema viário (pavimentação/drenagem/sinalização viária/iluminação pública), obras de drenagem e remanejamentos de água e esgoto, construção viaduto ferroviário, implantação de Via Permanente e Rede Aérea autocompensada e remodelação do pátio existente em Grajaú.

Seção Pública agendada para o dia 08/05/2018 para entrega das propostas técnicas/comerciais conforme edital da licitação.

OF.PR. 127 /2018

2.2.4. 4ª Licitação – não publicada, em fase de elaboração do edital (GPP/GRC/AEI)

2.3. Descreva e aponte, geometricamente, onde serão realizadas as obras.

Resposta DEBC - Obras Civis: Vide anexos 1 e 2

2.4. Qual é o prazo de duração de cada lote da obra licitada?

Resposta DEBC - Obras Civis:

2.4.1. 1ª Licitação: 18 meses – término do contrato out/19

2.4.2. 2ª Licitação: 18 meses – término do contrato out/19

2.4.3. 3ª Licitação: 18 meses – em fase de licitação - entrega das propostas técnicas/comercial: 08/mai/18

2.4.4. 4ª Licitação: em fase de elaboração do Termo de Referência (edital)

2.5. Qual é o valor contratado em cada lote?

Resposta DEBC - Obras Civis:

2.5.1 1ª Licitação: R\$ 6.673.048,21 (valor do contrato)

2.5.2 2ª Licitação: R\$ 18.350.767,10 (valor do contrato)

2.5.3 3ª Licitação: R\$ 88.967.680,78 (valor Termo Referência)

2.5.4 4ª Licitação: planilha sendo elaborada na GPP/GRC.

2.6. Qual é o cronograma de início das obras em cada lote?

2.6.1 1ª Licitação: 16/04/2018

2.6.2 2ª Licitação: 16/04/2018

2.6.3 3ª Licitação: em fase de licitação

2.6.4 4ª Licitação: cronograma em fase de elaboração na GPP.

2.7. Há impedimento para a execução de algum lote das obras?

Resposta DEBC - Obras Civis:

2.7.1 Conforme Licença de Implantação das obras da Extensão da Linha 9 Esmeralda os serviços só podem ser iniciados após a contratada atender as diretrizes das condicionantes da LI.

2.7.2 Desapropriações em andamento.

2.7.3 Remanejamentos de interferências das concessionárias e prefeitura (Eletropaulo, Sabesp e PMSP)

OF.PR. 127 /2018


3. Havia uma previsão de entrega em 2018. Isso irá se concretizar?

Resposta DEBC - Obras Civis: não há previsão de entrega em 2018.

4. Quando a estação Varginha será entregue a população?

Resposta DEBC - Obras Civis: necessário concluir o processo licitatório da concorrência de obras da Estação Varginha.


Respeitosamente,


VITOR WILSON GARCIA
Diretor Presidente em Exercício

EXTENSÃO LINHA 9 – ESMERALDA
 GRAJAÚ – VARGINHA

LOTE 1:

OBRAS COMPLEMENTARES PÁTIO GRAJAÚ ATÉ PI ESTRADA DOS MENDES
 OBRAS VIADUTOS RODOVIÁRIOS VR 1 - MICRONÉSIA VR2 - JACOPO TORRITI
KM 41+600 A 44+200

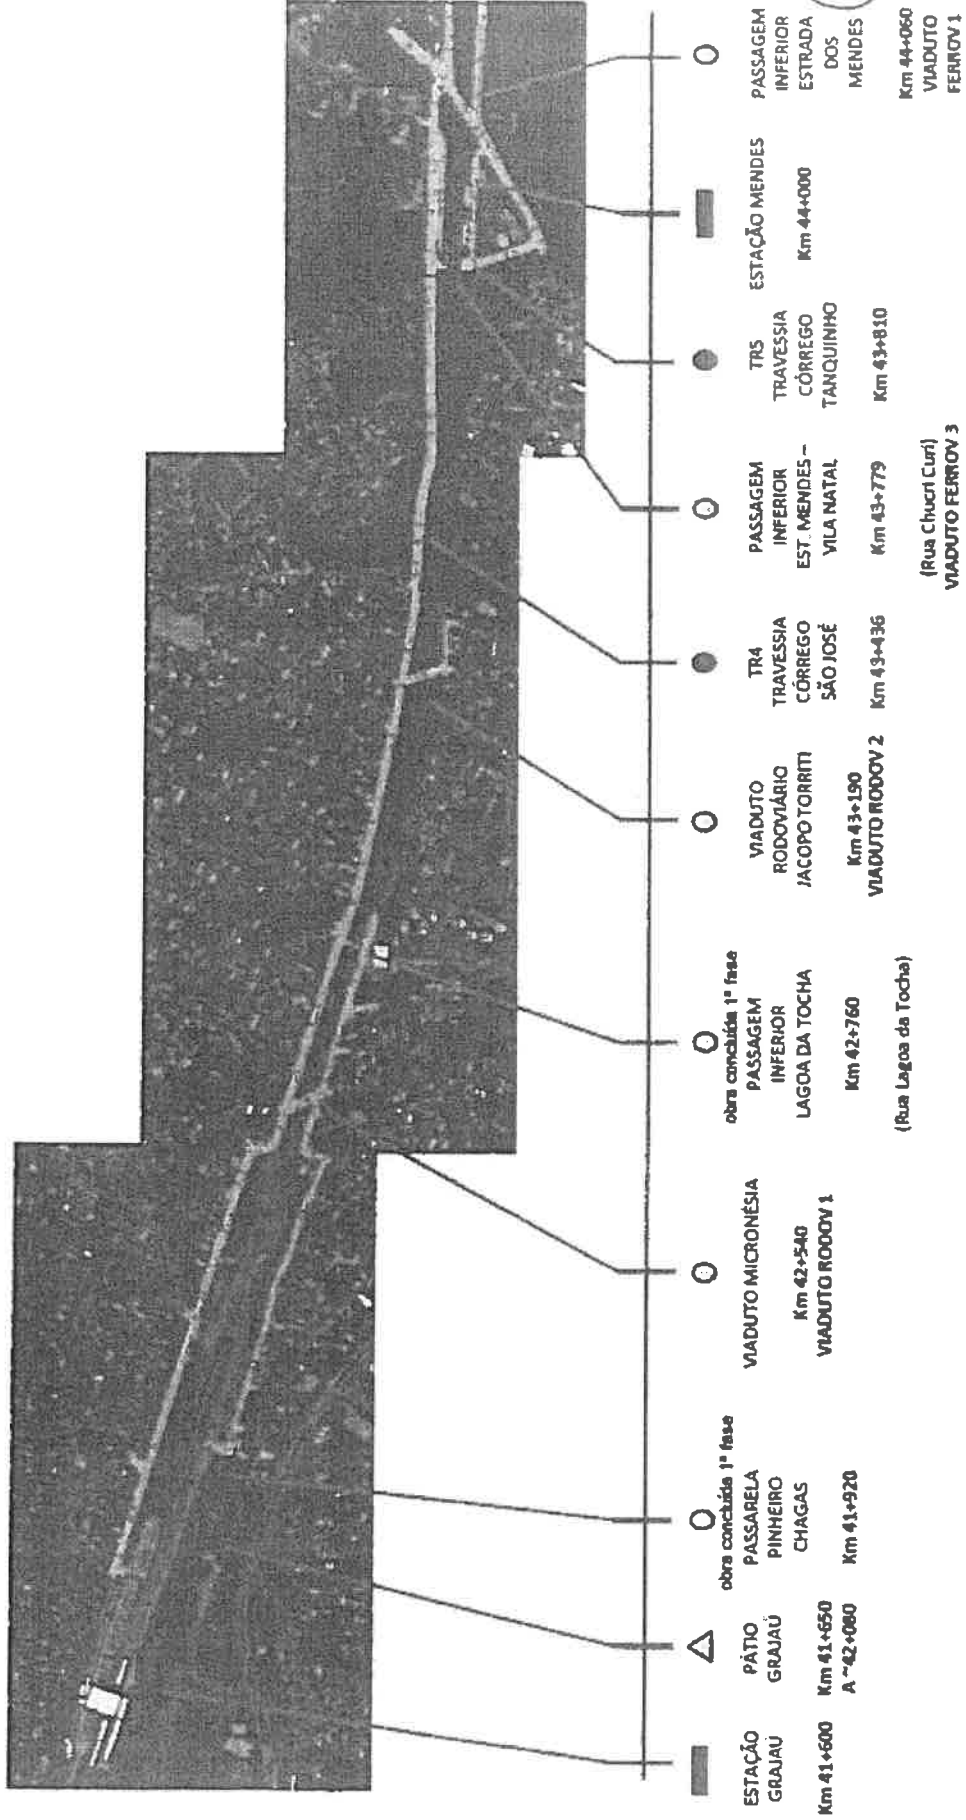




EXTENSÃO LINHA 9 – ESMERALDA
GRAJAU – VARGINHA

LOTE 2:

OBRAS COMPLEMENTARES PI ESTRADA DOS MENDES ATÉ O PÁTIO VARGINHA
OBRAS VIADUTOS RODOVIÁRIOS VR 3 - LIGAÇÃO LESTE/OESTE VR 4 PAULO G REMBERG

km 44+200 A 46+300





SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, 16 de julho de 2018.
Ofício GS/STM nº 317/2018

Ref.: Requerimento de Informação nº 149/2018
Autores: Deputado Estadual Enio Tatto - ALESP
Assunto: Requer ao Senhor Diretor-Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, informações sobre a Linha 09-Esmeralda da CPTM.

Senhor Assessor,

Com os meus cordiais cumprimentos, reportando-me ao assunto em referência, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria manifestação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – **CPTM**, consubstanciada no OF.PR. 230/2018, prestando as informações pertinentes à matéria (cópia anexa).

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.



GLODOALDO PELISSIONI
Secretário dos Transportes Metropolitanos

Ilustríssimo Senhor Assessor
RODRIGO EDSON FIERRO
Dirigente da Assessoria Técnica da Casa Civil – Gabinete do Governador
Av. Morumbi, 4.500
São Paulo - SP
CEP 05650-905

/arp/STM/ATG



OF. PR. 230/2018
16 de julho de 2018

Assunto: Esclarecimentos sobre a estação Varginha da Linha 09 – Esmeralda da CPTM

Reportamo-nos ao Despacho nº 188/2018 (AP nº 110/18) de 29/06/2018 pelo qual essa Assessoria Parlamentar da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 149/2018, do Nobre Deputado Estadual Enio Tatto, solicitando manifestações desta Companhia a respeito da estação Varginha na Linha 09 – Esmeralda sendo que, sobre o requerido, e articuladamente, reproduzindo as questões formuladas, aduzimos o que segue:

1. Qual é o cronograma de obra atualizado para execução e entrega da estação Varginha da Linha 09 – Esmeralda da CPTM?

Na presente data (julho/2018), o empreendimento como um todo encontra-se em determinadas fases, sejam elas de execução ou de adequações contratuais (planilhas / projetos), envolvendo as exigências do agente financeiro - CEF. Dessa forma não há um cronograma físico concluído para todas as obras da Extensão da Linha 9.

A futura estação de Varginha, está compreendido no trecho de obras civis, cuja contratação encontra-se ainda na fase de atendimento das exigências com a CEF. A previsão de assinar contrato: *Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando a Complementação das Obras Civis da Linha 9 - Esmeralda - trecho Grajaú e Varginha, Lote 2*, é em novembro deste ano. O cronograma contratual é de 30 meses.

2. A licitação das obras da Linha 9 – Esmeralda da CPTM foi dividida em lotes, conforme informação obtida junto a Companhia. Diante desse fato, questiona-se:

2.1. Quantas são as Licitações:

Obras civis são quatro (4) licitações e as de sistemas também são quatro (4).

2.2. Descreva os lotes em cada licitação.

2.4. Qual é o valor contratado em cada lote?

Ilustríssimo Senhor
Doutor FERNANDO HIROMITI MARUYAMA
DD. Coordenador de Relações Institucionais da
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos – STM
São Paulo – SP

- 2.5. Qual é o prazo de duração de cada lote da obra licitada?
2.6. Qual é o cronograma de início das obras em cada lote?

Obras Civas:

Licitação – Lote 1 – Viadutos Rodoviários: Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha.

Construção dos viadutos rodoviários (VR1 – Micronésia e VR2 – JacopoTorriti) envolvendo obras de contenções, viários, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.

Contratada: **Construtora Ubiratan**

Valor do contrato R\$ 6.673.048,21

Autorização de Início de Objeto AIO – 10/04/2018

Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.

Início do Contrato em 16/04/18.

Prazo de execução: 18 meses.

Licitação – Lote 2 – Viadutos Rodoviários: Execução de Obras para a Implantação de Viadutos Rodoviários para a Transposição da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, Trecho Grajaú – Varginha – Lote 2

Construção dos viadutos rodoviários (VR3 – Ligação Leste/Oeste VR4 – Paulo Guilguer Reimberg) envolvendo obras de contenções, viários, pavimentações, drenagem, iluminação pública e sinalização viária.

Contratada: **Consórcio Verdebianco/WVG**

Valor do Contrato R\$ 18.350.767,10

Autorização de Início Objeto – AIO – 10/04/2018

Ordem de Serviço emitida em 12/04/18.

Início do Contrato em 16/04/18.

Prazo de execução: 18 meses.

Licitação – Lote 1 – Obras Complementares: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos, visando Complementação da Extensão Ferroviária da Linha 9 Esmeralda, Trecho entre as Estações Grajaú e Varginha – Lote 1

Envolvem a conclusão da Estação Mendes/Vila Natal – com serviços executivos de estrutura de concreto, estrutura metálica, acabamentos, rotas táteis, comunicação visual fornecimento e

instalação de equipamentos elétrico/eletrônico e equipamentos auxiliares (escadas rolantes, elevador e sistema de ventilação), obras do sistema viário (pavimentação/drenagem/sinalização viária/iluminação pública), obras de drenagem e remanejamentos de água e esgoto, construção viaduto ferroviário, implantação de Via Permanente e Rede Aérea autocompensada e remodelação do pátio existente em Grajaú.

Em processo licitatório na fase de análise de documentações para habilitação. Por enquanto, a empresa ganhadora: **Consórcio Concrejato / Alberoni e Arruda**, com o valor de R\$ 76.399.192,33.

Prazo contratual: 30 meses

Licitação – Lote 2 – Obras Complementares: Execução de Obras e Serviços de Engenharia, com Fornecimento de Materiais e Equipamentos, visando Complementação da Extensão Ferroviária da Linha 9 Esmeralda, Trecho entre as Estações Grajaú e Varginha – Lote 2

Envolvem a conclusão da Estação Varginha – com serviços executivos de estrutura de concreto, estrutura metálica, acabamentos, rotas táteis, comunicação visual fornecimento e instalação de equipamentos elétrico/eletrônico e equipamentos auxiliares (escadas rolantes, elevador e sistema de ventilação), obras do sistema viário (pavimentação/drenagem/sinalização viária/iluminação pública), obras de drenagem e remanejamentos de água e esgoto, construção viaduto ferroviário, implantação de Via Permanente e Rede Aérea autocompensada em todo o trecho, inclusive no novo pátio de Varginha.

Na fase de análise de documentações no agente financeiro – CEF, para posterior processo licitatório.

Sistemas:

Licitação – Sistemas de Sinalização e Telecomunicações: Contrato assinado no valor de R\$ 49.324.404,41 e prazo de execução de 24 meses.

Licitação – Adequação do CCO: Contrato assinado no valor de R\$ 42.483.047,01 e prazo de execução de 12 meses.

Licitação – Sistemas de Energia: Aguardando análise da documentação enviada a CEF, para posterior processo licitatório.

Licitação – Reforço de Rede Aérea: Contrato assinado no valor de R\$ 11.290.854,77 e prazo de execução de 24 meses.

2.3. Descreva e aponte, geometricamente, onde serão realizadas as obras.

Vide **anexos 1 e 2**

2.7. Há impedimento para a execução de algum lote das obras?

- Licença de Implantação das obras da Extensão da Linha 9 - Esmeralda os serviços só podem ser iniciados após a contratada atender as diretrizes das condicionantes da LI.
- Desapropriações em andamento.
- Remanejamentos de interferências das concessionárias e prefeitura (Eletropaulo, Sabesp e PMSP)

2.8. Havia uma previsão de entrega em 2018. Isso irá se concretizar?
Não.

2.9. Quando a estação Varginha será entregue a população?
Sem previsão. Uma vez que se encontra em fase de análise no agente financeiro – CEF, para posteriores deliberações de processo licitatório e contratação.

Apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES
Diretor Presidente

ANEXO 2
EXTENSÃO LINHA 9 – ESMERALDA
 GRAJAU – VARGINHA

LOTE 2:
 OBRAS COMPLEMENTARES PI ESTRADA DOS MENDES ATÉ O PÁTIO VARGINHA
 OBRAS VIADUTOS RODOVIÁRIOS VR 3 - LIGAÇÃO LESTE/OESTE VR 4 PAULO G. REIMBERG

km 44+200 A 46+300

