



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, 02 de outubro de 2017.
Ofício GS/STM nº 555/2017

Ref.: Requerimento de Informação nº 358/2017
Autor: Deputado Estadual Enio Tatto - ALESP
Assunto: Requer informações, atualizadas, sobre o cronograma de execução das obras da Estação Varginha da Linha 9-Esmeralda da CPTM.

Senhora Assessora,

Com os meus cordiais cumprimentos, reportando-me ao assunto em referência, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria manifestação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - **CPTM**, consubstanciada no OF.PR 342/2017, prestando as informações pertinentes à matéria (cópia anexa).

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.

CLODOALDO PELISSIONI
Secretário dos Transportes Metropolitanos

Ilustríssima Senhora Assessora
JULIANA OGAWA
Dirigente da Assessoria Técnica da Casa Civil – Gabinete do Governador
Av. Morumbi, 4.500
São Paulo - SP
CEP 05650-905

MIV/arp/STM/ATG



OF. PR 342 / 2017

25 de setembro de 2017

Resposta ao Despacho 283/2017 (AP nº 250) – Ofício SGP nº 1745/2017 – Requerimento nº 358/2017 sobre o andamento das obras do trecho Grajaú – Varginha da linha 9 – Esmeralda.

Com relação ao ofício em questão, onde solicita informações decorrentes do Requerimento nº 358/2017 apresentado pelo Deputado Enio Tatto com relação ao andamento das obras do trecho Grajaú – Varginha da linha 9 – Esmeralda da CPTM, temos a informar:

Andamento das licitações e contratos

- **Implantação de viadutos rodoviários – Lote 1:** empresa ganhadora do certame declinou do contrato. Será iniciado novo processo licitatório.
- **Implantação de viadutos rodoviários – Lote 2:** processo em licitação na fase de análise das propostas comerciais da sessão pública.
- **Complementação das obras civis – Lote 1:** em elaboração de documentação para envio a Caixa Econômica Federal e posterior início do processo licitatório.
- **Complementação das obras civis – Lote 2:** em elaboração de documentação para envio a Caixa Econômica Federal e posterior início do processo licitatório.
- **Sistemas de sinalização e telecomunicações:** contrato assinado no valor de R\$ 49.324.404,41 e prazo de execução de 24 meses, com o início dos serviços condicionado a aprovação de início de objeto do Ministério das Cidades.

Ilmo. Sr.
FERNANDO HIMROMITI MARUYAMA
Coordenador de Relações Internacionais da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo
São Paulo – SP

OF.PR. / 2017

- **Adequação de CCO:** contrato assinado no valor de R\$ 42.483.047,01 e prazo de execução de 12 meses, com o início dos serviços condicionado a aprovação de início de objeto do Ministério das Cidades.
- **Sistema de energia:** aguardando análise de documentação enviada a Caixa Econômica Federal.
- **Reforço de Rede Aérea:** contrato assinado no valor de R\$ 11.290.854,77 e prazo de execução de 24 meses, aguardando julgamento de recurso.

Todos os lotes e licitações são financiados pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) através da Caixa Econômica Federal, condicionado a aprovação de início de objeto do Ministério das Cidades, motivo pelo qual ainda não é possível fornecer informações com relação a cronogramas, prazos de entrega e valores de serviços ainda não contratados.

Em anexo, segue apresentação dos locais das obras do trecho Grajaú – Varginha da linha 9 – Esmeralda.

Atenciosamente,



PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES
Diretor Presidente

Diagrama Unifilar da Extensão da Linha 9

LOTE 1: PÁTIO GRAJAÚ ATÉ PI ESTRADA DOS MENDES

KM 41+600 A 44+200

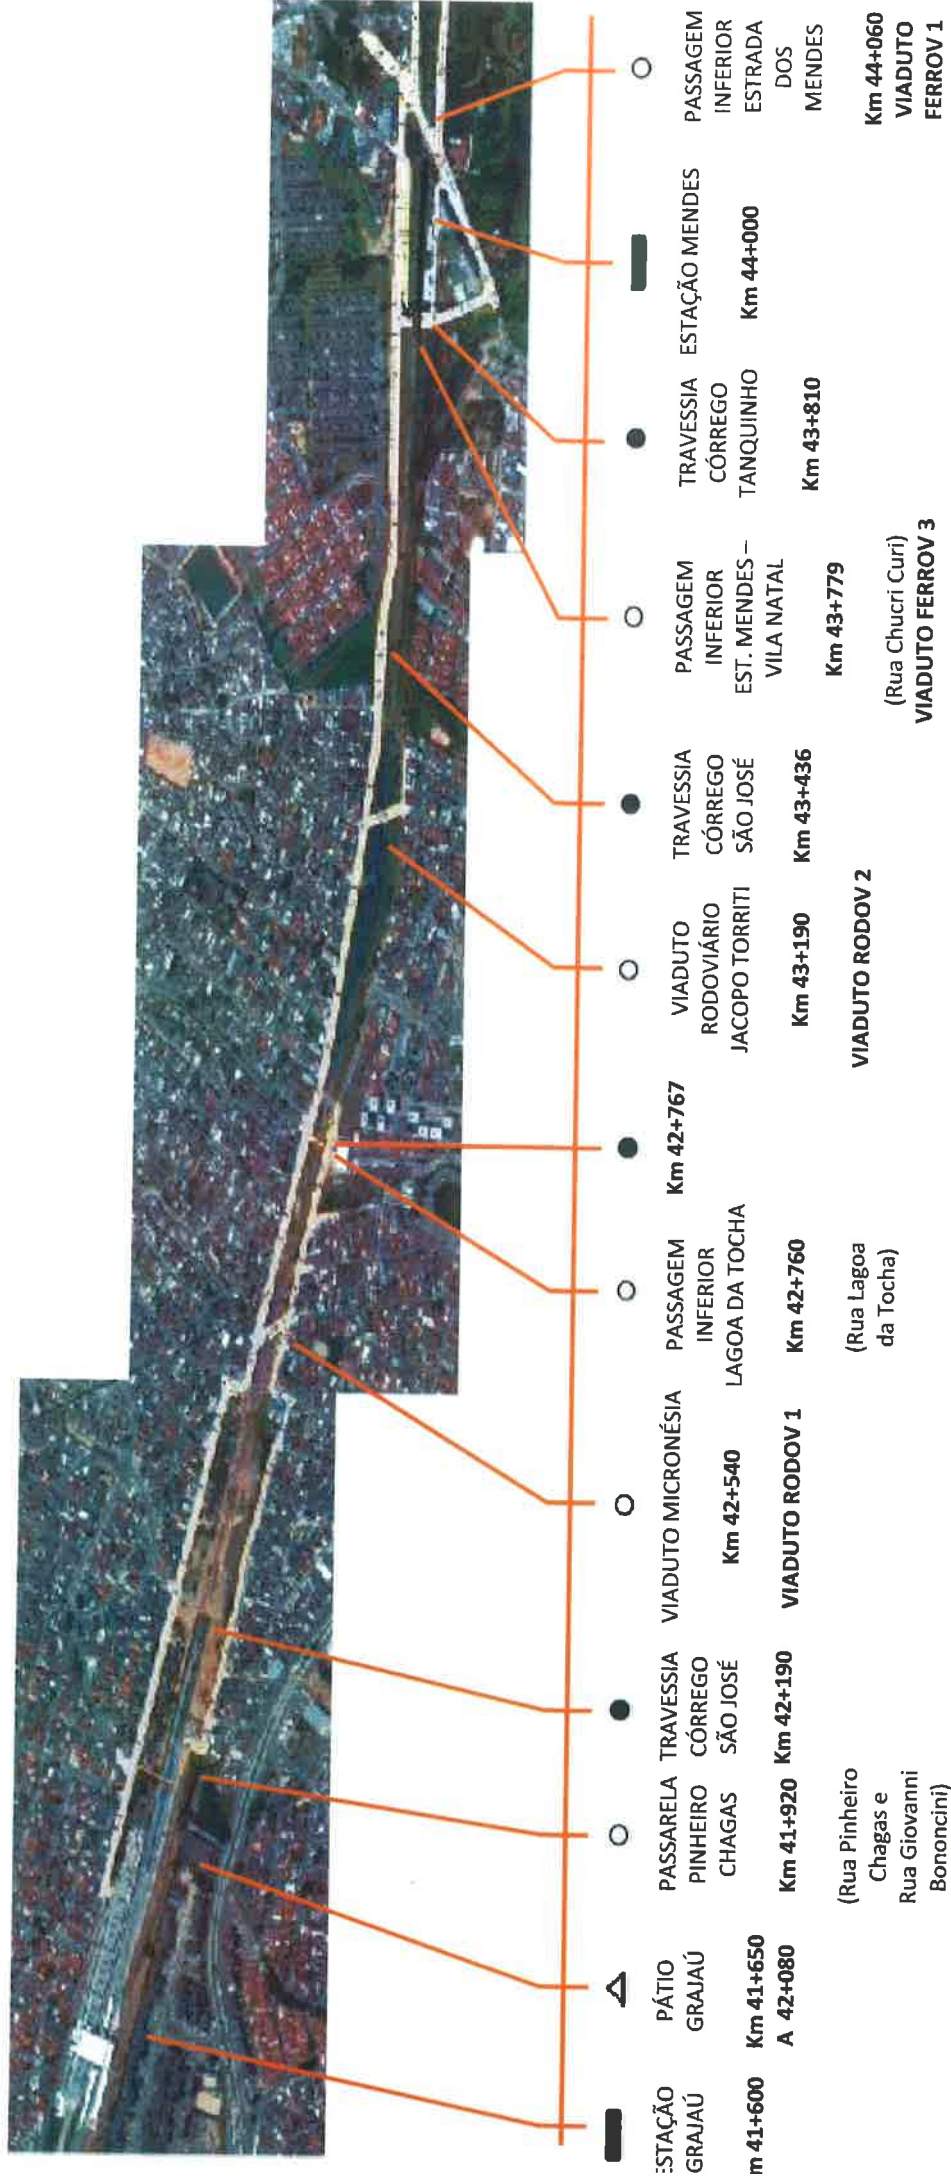


Diagrama Unifilar da Extensão da Linha 9

LOTE 2: INÍCIO DO LOTE ATÉ PÁTIO VARGINHA
KM 44+200 A 46+300

